


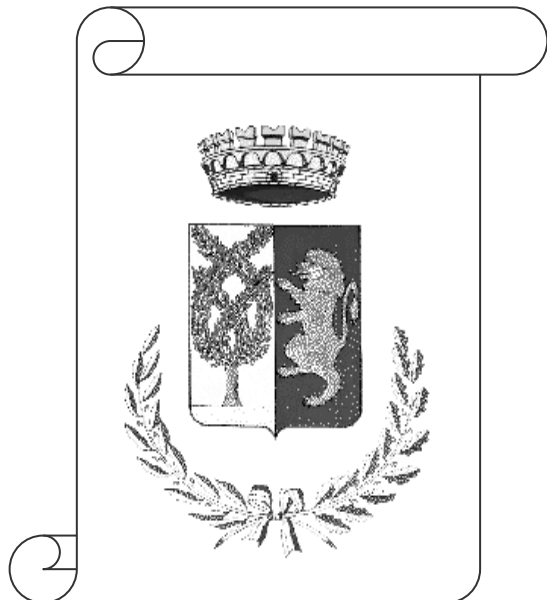

COMUNE
di
**MONASTERO
BORMIDA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

67

OGGETTO: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – INTERVENTO 0231 – DISCIPLINARE N. 31.15 APPROVATO CON D.M. N. 3680 DEL 17/03/2014 – LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO MULTIFUNZIONALE COMUNALE “AUGUSTO MONTI”
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL X S.AL. FINALE DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE, DELLA CONTABILITA’ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA RELAZIONE ASSEVERATA DEL R.U.P. PER LA CHIUSURA DELLA PRATICA E LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

L'anno **duemiladiciannove** addì 19 del mese di SETTEMBRE alle ore 17;30 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, convocati i componenti della Giunta comunale, risultano :

	Presenti	Assenti
1. GALLARETO LUIGI - Sindaco	X	
2. VISCONTI LUCA - Assessore	X	
3. STANGA SECONDO - Assessore	X	

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott. DODERO MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GALLARETO LUIGI, Sindaco, assunta la presidenza e dichiara aperta la seduta, invita tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Monastero Bormida ha avuto accesso al finanziamento di cui all'art.18 c.9 del DL 21.06.2013, n. 69, convertito in legge 9.08.2013, n.98, ed i lavori di NUOVA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO MULTIFUNZIONALE COMUNALE "AUGUSTO MONTI" in oggetto sono stati inseriti nell'elenco approvato dal Ministero dei trasporti n. 470 del 27.12.2013 e comunicato con nota n. 000618 in data 15.01.2014;
- che pertanto la copertura delle spese di realizzazione dell'opera è assicurata in toto con il suddetto finanziamento statale;
- che con determinazione n. 32/2013 del 16/09/2013 venivano incaricati delle operazioni di rilievo, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza i tecnici Ing. Giovanni Guglieri con sede in Monastero Bormida, via Europa 7 e arch. Fabrizio Naldini con sede in Acqui Terme, Piazza Italia n. 9;
- che con propria delibera n. 73 in data 24/09/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione a firma dei tecnici incaricati Naldini e Guglieri di Acqui Terme;
- che con propria precedente delibera n. 79 del 17/10/2013 veniva approvata l'istanza di richiesta di contributo e veniva nominato quale R.U.P. il geom. Mauro Ciprotti, responsabile del Settore tecnico del Comune di Monastero Bormida;
- che al progetto in oggetto è stato assegnato il C.U.P. I33B14000010001;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato il CIG: 5768124680;
- che il progetto in oggetto è identificato con il Codice Intervento n. 0231 – disciplinare n. 31.15 del 10/03/2014 approvato con D.M. n. 3680 del 17/03/2014 – comunicazione di esecutorietà del disciplinare del 23/06/2014;
- che con propria delibera n. 44 in data 01/08/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione a firma dei tecnici incaricati Naldini e Guglieri di Acqui Terme, con il seguente quadro economico:

			€ 746.455,00
1.	LAVORI A BASE D'ASTA		
1.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA		
1.1.1	Lavori a misura		
1.1.2	Lavori a corpo in variante	€ 721.955,00	
1.1.3	Lavori in economia	€ -	
1.1.4	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA	€ 721.955,00	
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI		
1.2.1	Oneri per la sicurezza per lavori a misura	€ -	
1.2.2	Oneri per la sicurezza per lavori a corpo	€ 24.500,00	
1.2.3	Oneri per la sicurezza per lavori in economia	€ -	
1.2.4	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI	€ 24.500,00	
1.3	COSTO STIMATO MANODOPERA:		
1.3.1	a) per lavori a misura	€ -	
1.3.2	b) a corpo	€ 460.029,73	
1.3.3	c) in economia	€ -	
1.4	TOTALE COSTO STIMATO MANODOPERA	€ 460.029,73	
1.4	LAVORI A BASE D'ASTA (al netto di costi manodopera e oneri per la sicurezza)		
1.4.1	a) a misura	€ -	
1.4.2	b) a corpo	€ 261.925,27	
1.4.3	c) in economia	€ -	
1.5	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (al netto di costi manodopera e oneri sicurezza)	€ 261.925,27	
2.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 213.545,00

2.1	Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	€	-	
2.2	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari geologiche, b) rilievi del sito, c) altro a) indagini	€	2.500,00	
2.3	Allacciamenti ai pubblici servizi acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro a)	€	6.587,49	
2.4	Maggiori lavori imprevisi	€	4.331,27	
2.5	Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 133, comma 3, DLgs n.163/2006, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni	€	-	
2.6	Acquisizione od espropriazione di aree o immobili a) acquisto	€	15.990,00	
2.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€	68.645,50	
2.8	Accantonamenti per fondo di cui all'Art. 92 DLgs.n.163/2006 (<i>incentivi</i>)	€	14.439,10	
2.9	Spese per stati di consistenza, frazionamenti (<i>compresi contributi integrativi casse di prev.</i>)	€	-	
2.10	Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni, rogito di acquisto	€	1.500,00	
2.11	Spese per commissioni giudicatrici art.84 DLgs.n.163/2006	€	1.000,00	
2.12	Spese per pubblicità art.80 DLgs.n.163/2006 Spese per opere d'arte	€	600,00	
2.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€	3.500,00	
2.14	Contributo ex A.V.C.P.	€	300,00	
2.15	I.V.A. su lavori di:	<i>base imponibile</i>	<i>% IVA</i>	<i>IVA</i>
	a) eliminazione barriere architettoniche		4%	€ -
	b) costruzione opere di urbanizzazione	€ 746.455,00	10%	€ 74.645,50
	c) ristrutturazione, risanamento e restauro	€ -	10%	€ -
	d) manutenzione straordinaria		22%	€ -
	e) altri lavori	€ -	22%	€ -
	I.V.A. su somme a disposizione:			
	f) lavori in economia	€ -	22%	€ -
	g) rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.500,00	22%	€ 550,00
	h) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.587,49	22%	€ 1.449,25
	i) lavori imprevisi	€ 4.331,27	22%	€ 952,88
	l) incremento del prezzo chiuso	€ -	22%	€ -
	m) spese tecniche	€ 68.645,50	22%	€ 15.102,01
	n) spese per stati di consistenza, frazionamenti	€ -	22%	€ -
	o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni	€ 1.500,00	22%	€ 330,00
	p) commissioni giudicatrici	€ 1.000,00	22%	€ 220,00
	q) pubblicità	€ 600,00	22%	€ 132,00
	r) accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 3.500,00	22%	€ 770,00
	TOTALE PER IVA			€ 91.151,64
				€ 94.151,64
2.16	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	213.545,00	
3.	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 960.000,00

- che in seguito alle risultanze di gara, i lavori sono stati affidati alla ditta CAPRA, via Levata n.6 (fraz. Spinetta Marengo) 15100 ALESSANDRIA, per l'importo complessivo contrattuale di € **669.710,90**, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari al 29,300 sull'importo soggetto a ribasso d'asta pari ad € 261.925,27 oltre ad € 24.500,00 quali oneri per la sicurezza ed € 460.029,73 quali costi per la manodopera, entrambi non soggetti a ribasso
- che i lavori hanno avuto regolare inizio in data 13.10.2014;

- che con deliberazione G.C. n. 20 del 21/03/2017 è stata approvata una variante al progetto dalla quale risulta un aumento complessivo della spesa di € 42.352,47 per maggiori lavori consistenti nella realizzazione di collegamento alla rete fognaria pubblica, spesa che trova copertura nell'originario importo complessivo di progetto autorizzato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Disciplinare sottoscritto tra il Comune di Monastero Bormida e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che a seguito della suddetta perizia di variante il nuovo quadro economico era così composto:

COMUNE DI MONASTERO BORMIDA - PROVINCIA DI ASTI - REGIONE PIEMONTE Piazza Castello n. 1 - Tel. 0144 / 88012 PROGETTO PER I LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO MULTIFUNZIONALE COMUNALE "AUGUSTO MONTI" da realizzare in Monastero Bormida (AT) Viale Indipendenza a completamento degli impianti sportivi e ricreativi esistenti - 1° lotto funzionale Codice intervento n. 0231 - disciplinare n. 3115 del 10/03/2014 approvato con D.M. n. 3680 del 17/03/2014 comunicazione di esecutorietà del disciplinare del 23/06/2014 CUP: I33B14000010001 - CIG: 5768124680												
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO IN VARIANTE												
	PROGETTO APPROVATO		AGGIUDICAZIONE		VARIANTE		DIFFERENZA					
												%
1. LAVORI A BASE D'ASTA												
1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA												
1.1.1 Lavori a misura	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.1.2 Lavori a corpo	€ 721.955,00		€ 721.955,00		€ 751.323,92		€ 29.368,92		€ 29.368,92		4,07%	
1.1.3 Lavori in economia	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.1.4 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA	€ 721.955,00		€ 721.955,00		€ 751.323,92		€ 29.368,92		€ 29.368,92		4,07%	
1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI												
1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo	€ 24.500,00		€ 24.500,00		€ 31.674,80		€ 7.174,80		€ 7.174,80		29,28%	
1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.2.4 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI	€ 24.500,00	€ 746.455,00	€ 24.500,00	€ 669.710,90	€ 31.674,80	€ 703.132,68	€ 7.174,80	€ 7.174,80	€ 7.174,80	€ 33.421,78	4,99%	
1.3 COSTO STIMATO MANODOPERA:												
1.3.1 a) per lavori a misura	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.3.2 b) a corpo	€ 460.029,73		€ 460.029,73		€ 478.743,60		€ 18.713,88		€ 18.713,88		4,07%	
1.3.3 c) in economia	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.4 TOTALE COSTO STIMATO MANODOPERA	€ 460.029,73		€ 460.029,73		€ 478.743,60		€ 18.713,88		€ 18.713,88		4,07%	
1.4 LAVORI A BASE D'ASTA (al netto di costi manodopera e oneri per la sicurezza)												
1.4.1 a) a misura	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.4.2 b) a corpo	€ 261.925,27		€ 261.925,27		€ 272.580,32		€ 10.655,04		€ 10.655,04		4,07%	
1.4.3 c) in economia	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
1.5 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (al netto di costi manodopera e oneri sicurezza)	€ 261.925,27		€ 261.925,27		€ 272.580,32		€ 10.655,04		€ 10.655,04		4,07%	
RIBASSO d'asta del 29,30%												
29,30%												
Importo dei lavori e delle spese al netto del ribasso d'asta			€ 76.744,10		€ 79.866,03		€ 3.121,94		€ 3.121,94			
			€ 185.181,18		€ 192.714,28		€ 7.533,11		€ 7.533,11		4,07%	
1.5 Importo totale dei lavori e delle spese a base di consegna				€ 669.710,90		€ 703.132,68		€ 33.421,78		€ 33.421,78	4,99%	
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE												
2.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
2.2 Rilevi, accertamenti e indagini preliminari	€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 3.000,00		€ 500,00		€ 500,00		20,00%	
2.2.1 a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
2.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.587,49		€ 6.587,49		€ 6.587,49		€ -		€ -		0,00%	
2.2.3 a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro	€ 4.331,27		€ 4.331,27		€ 4.331,27		€ -		€ -		0,00%	
2.4 Maggiori lavori previsti	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
2.5 Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 133, comma 3, DLgs n.163/2006, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
2.6 Acquisizione od espropriazione di aree o immobili	€ 15.990,00		€ 15.990,00		€ 15.990,00		€ -		€ -		0,00%	
2.6.1 a) acquisto	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€ 68.645,50		€ 68.645,50		€ 72.070,91		€ 3.425,41		€ 3.425,41		4,99%	
2.8 Accantonamenti per fondo di cui all'Art. 92 DLgs n. 163/2006 (incentivi)	€ 14.439,10		€ 14.439,10		€ 15.026,48		€ 587,38		€ 587,38		4,07%	
2.9 Spese per stati di consistenza, frazionamenti (compresi contributi integrativi casse di prev.)	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
2.10 Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni, rogito di acquisto	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ -		€ -		0,00%	
2.11 Spese per commissioni giudicatrici art.84 DLgs n.163/2006	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -		€ -		0,00%	
2.12 Spese per pubblicità art.80 DLgs n.163/2006	€ 600,00	€ 213.545,00	€ 600,00	€ 205.970,59	€ 1.000,00	€ 214.801,28	€ -	€ -	€ -	€ 8.930,69	4,34%	
2.12.1 Spese per opere d'arte	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		0,00%	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.673,88		€ 173,88		€ 173,88		4,97%	
2.14 Contributo ex A.V.C.P.	€ 300,00		€ 300,00		€ 300,00		€ -		€ -		0,00%	
I.V.A. su lavori di:												
a) eliminazione barriere architettoniche	base imponibile	% IVA	base imponibile	% IVA	base imponibile	% IVA						
b) costruzione opere di urbanizzazione	€ 746.455,00	4%	€ 746.455,00	4%	€ 703.132,68	4%	€ -		€ -			
c) ristrutturazione, risanamento e restauro	€ -	10%	€ -	10%	€ -	10%	€ -		€ -			
d) manutenzione straordinaria	€ -	22%	€ -	22%	€ -	22%	€ -		€ -			
e) altri lavori	€ -	22%	€ -	22%	€ -	22%	€ -		€ -			
I.V.A. su somme a disposizione:												
f) lavori in economia	€ -	22%	€ -	22%	€ -	22%	€ -		€ -			
g) rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.500,00	22%	€ 550,00		€ 3.000,00	22%	€ 660,00		€ 660,00			
h) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.587,49	22%	€ 1.449,25		€ 6.587,49	22%	€ 1.449,25		€ 1.449,25			
i) lavori improvvisi	€ 4.331,27	22%	€ 952,88		€ 4.331,27	22%	€ 952,88		€ 952,88			
l) incremento del prezzo chiuso	€ -	22%	€ -		€ 4.331,27	22%	€ 952,88		€ 952,88			
m) spese tecniche	€ 68.645,50	22%	€ 15.102,01		€ 72.070,91	22%	€ 15.855,60		€ 15.855,60			
n) spese per stati di consistenza, frazionamenti	€ -	22%	€ -		€ 72.070,91	22%	€ 15.855,60		€ 15.855,60			
o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni	€ 1.500,00	22%	€ 330,00		€ 1.500,00	22%	€ 330,00		€ 330,00			
p) commissioni giudicatrici	€ 1.000,00	22%	€ 220,00		€ 1.000,00	22%	€ 220,00		€ 220,00			
q) pubblicità	€ 600,00	22%	€ 132,00		€ 1.000,00	22%	€ 220,00		€ 220,00			
r) accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 3.500,00	22%	€ 770,00		€ 600,00	22%	€ 132,00		€ 132,00			
TOTALE PER IVA	€ 94.151,64		€ 86.477,23		€ 90.721,25		€ 808,25		€ 808,25			
2.16 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 213.545,00		€ 205.970,59		€ 214.801,28		€ 8.930,69		€ 8.930,69		4,34%	
3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 960.000,00		€ 875.581,49		€ 917.933,96		€ 42.352,47		€ 42.352,47	4,84%	

VISTO che

- con determinazione del responsabile del servizio n. 13 del 16/06/2015 è stato approvato il I S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 117.176,09 oltre IVA di legge, per un totale di € 128.893,69;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 15 del 05/08/2015 è stato approvato il II S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 76.480,82 oltre IVA di legge, per un totale di € 84.128,90;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 27/2015 è stato approvato il III S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 79.466,47 oltre IVA di legge, per un totale di € 87.413,12;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 06 del 11/04/2016 è stato approvato il IV S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 90.687,17 oltre IVA di legge, per un totale di € 99.755,89;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 02 del 13/01/2017 è stato approvato il V S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 70.061,08 oltre IVA di legge, per un totale di € 77.067,19;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 02 del 13/01/2017 è stato approvato il VI S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 52.592,22 oltre IVA di legge, per un totale di € 57.851,44;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 21/08/2017 è stato approvato il VII S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 91.201,89 oltre IVA di legge, per un totale di € 100.322,08;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 21/08/2017 è stato approvato il VIII S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 86.329,05 oltre IVA di legge, per un totale di € 94.961,96;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 3 del 20/02/2018 è stato approvato il IX S.A.L. dei lavori in oggetto liquidando alla ditta esecutrice Impresa Capra di Alessandria la somma di € 32.146,43 oltre IVA di legge, per un totale di € 35.361,08;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 04 del 09/02/2015 è stato approvato il I stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 44.581,19, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 56.564,60;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 13 del 16/06/2015 è stato approvato il II stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 7226,59, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 9.169,08;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 13 del 16/06/2015 è stato approvato il III stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 4140,05, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 5252,88, nonché la fattura n. 61/2014 dello studio Associato Erredb dei dott. Geol. Stefano De Bortoli e Claudio Riccabone di Canelli per un importo complessivo di € 1555,50;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 27/2015 è stato approvato il IV stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 3471,92, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 4.405,18;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 06 del 11/04/2016 è stato approvato il V stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 3528,96, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 4.477,55;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 02 del 13/01/2017 è stato approvato il VI stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 2082,96, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 2.642,48;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 02 del 13/01/2017 è stato approvato il VII stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 2200,00, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 2.791,36;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 21/08/2017 è stato approvato il VIII stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 2997,72, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 3.803,51;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 21/08/2017 è stato approvato il IX stato di avanzamento delle spese tecniche per complessivi € 1700,00, oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 2.156,96;

CONSIDERATO che i lavori sono ultimati in data 04/10/2018, come da certificato di definitiva ultimazione dei lavori prot. N. 3689 del 11/10/2018;

VISTI

- il X S.A.L. finale dei lavori e il relativo certificato di pagamento a favore della ditta Impresa Capra di Alessandria di € 6991,46 oltre IVA di legge, per un totale di € 7.690,60;
- il X stato di avanzamento delle spese tecniche e il relativo certificato di pagamento a favore dei tecnici incaricati ing. Giovanni Guglieri e arch. Fabrizio Naldini di € 1315,00 oltre IVA di legge e CNPAIA, per un totale di € 1.668,47;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e le allegate documentazioni relative agli impianti e alle relative certificazioni;

CONSIDERATO

- che, nonostante la dichiarazione di fine lavori e la relativa chiusura del cantiere, restavano da eseguire alcune delle opere previste nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui completamento ha portato alla definitiva chiusura della pratica in data odierna;
- che alcune delle voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione sono state implementate con l'utilizzo delle economie, per quanto riguarda le seguenti voci: acquisizione dell'area, accatastamento dell'edificio realizzato, realizzazione di opere esterne complementari alla corretta fruizione sportiva dell'impianto

VISTO il Quadro Economico finale, redatto dai tecnici incaricati e comprendente la situazione aggiornata delle somme a disposizione dell'Amministrazione, che è la seguente:

COMUNE DI MONASTERO BORMIDA - PROVINCIA DI ASTI - REGIONE PIEMONTE				
PROGETTO PER I LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO MULTIFUNZIONALE COMUNALE "AUGUSTO MONTE" da realizzare in Monastero Bormida (AT) Viale Indipendenza e completamento degli impianti sportivi e ricreativi esistenti - 1° lotto funzionale Codice intervento n. 0231 - disciplina n. 3115 del 10/03/2014 approvato con D.M. n. 3690 del 17/03/2014 comunicazione di esecutorietà del disciplinare del 23/06/2014 CUP: I33B14000010001 - CIG: 5758124680				
QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO FINALE DELL'INTERVENTO				
1. LAVORI A BASE D'ASTA				
1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA				
1.1.1 Lavori a misura			€	-
1.1.2 Lavori a corpo			€	761.323,92
1.1.3 Lavori in economia			€	-
1.1.4 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA			€	761.323,92
1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI				
1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura			€	-
1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo			€	31.874,80
1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia			€	-
1.2.4 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI			€	31.874,80
1.3 COSTO STIMATO MANODOPERA				
1.3.1 a) per lavori a misura			€	-
1.3.2 b) a corpo			€	478.743,80
1.3.3 c) in economia			€	-
1.4 TOTALE COSTO STIMATO MANODOPERA			€	478.743,80
1.4.1 a) a misura			€	-
1.4.2 b) a corpo			€	272.680,32
1.4.3 c) in economia			€	-
1.5 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (al netto di costi manodopera e oneri sicurezza)			€	272.680,32
1.5.1 RIBASSO d'asta del 25,30%			€	78.888,03
1.5.2 Importo dei lavori e delle spese al netto del ribasso d'asta			€	193.792,29
1.6 Importo totale dei lavori e delle spese 10° S.A.L. a tutto il 01/10/2018			€	703.132,68
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
2.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto			€	-
2.2 Rilevi, accertamenti e indagini preliminari a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro			€	3.000,00
2.3 Allacciamenti ai pubblici servizi: a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro			€	8.288,91
2.4 Migliori lavori imprevisti, autorizzati con D.D. R.U.P. n. 25 del 13/06/2019			€	12.700,76
2.5 Incremento del prezzo chiuso al sensi dell'articolo 133, comma 3, DLgs n. 163/2006, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni			€	-
2.6 Acquisizione ed espropriazione di aree e immobili a) acquisto			€	35.024,00
2.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)			€	72.070,91
2.8 Accantonamenti per fondo di cui all'Art. 92 DLgs n. 163/2006 (incentivi)			€	15.026,48
2.9 Spese per studi di consistenza, frazionamenti, accatastamento, acta antimando, egibilità (compresi contributi integrativi casse di previdenza, oneri catastali e spese V.V.F.)			€	8.236,37
2.10 Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni, rogito di acquisto			€	4.466,97
2.11 Spese per commissioni giudiziarie art.64 DLgs n. 163/2006			€	-
2.12 Spese per pubblicità art.80 DLgs n. 163/2006			€	1.160,00
2.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici ed altri eventuali collaudi specializzati, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)			€	3.873,88
2.14 Contributo ex A.V.C.P.			€	376,00
I.V.A. su lavori di:	base imponibile	% IVA	IVA	
a) eliminazione barriere architettoniche		4%	€	-
b) costruzione opere di urbanizzazione	€ 703.132,68	10%	€	70.313,27
c) installazione, mantenimento e riutilizzo	€ -	0%	€	-
d) manutenzione straordinaria	€ -	0%	€	-
e) altri lavori	€ -	0%	€	-
I.V.A. su somme a disposizione:				
f) lavori in economia	€ -	0%	€	-
g) rilievi, accertamenti, indagini	€ 3.000,00	0%	€	550,00
h) allacciamenti e pubblica utilità	€ 8.288,91	0%	€	1.505,28
i) lavori imprevisti	€ 12.700,76	0%	€	2.324,17
l) incremento del prezzo chiuso	€ -	0%	€	-
m) spese tecniche	€ 72.070,91	0%	€	13.388,80
n) spese per studi di consistenza, frazionamenti	€ 8.236,37	0%	€	1.511,78
o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni	€ 4.466,97	0%	€	830,51
p) commissioni giudiziarie	€ -	0%	€	-
q) pubblicità	€ 1.160,00	0%	€	213,00
r) accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 3.873,88	0%	€	723,25
TOTALE PER IVA			€	94.861,04
2.15 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	268.867,32
3. IMPORTO TOTALE CONSUNTIVO LAVORI E SPESE a tutto il 20/09/2019			€	960.000,00
4. IMPORTO COMPLESSIVO INIZIALE DEL PROGETTO			€	960.000,00
5. RESIDUO INUTILIZZATO			€	0,00
MONASTERO BORMIDA (AT)				
8 agg. 2009/2019				
IL R.U.P.:	I D.L. INCARICATI:		L'IMPRESA APPALTRICE:	
Giov. MAURO CIPROTTI	ING. GIOVANNI GUGLIERI		CAPRA SPA	

RILEVATO, nello specifico, che le somme a disposizione dell'Amministrazione, ad esclusione delle spese tecniche già rendicontate come sopra specificato, sono state impegnate come segue:

- PUNTO 2.2 del Q.E. finale – ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

- Opere di allacciamento ai pubblici servizi: affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio alla ditta Amag Reti Idriche - importo € 2370,64 IVA compresa – Fattura n. 75036 del 31/03/2017;
- Opere di allacciamento ai pubblici servizi: affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio alla ditta Enel Distribuzione - importo € 2379,93 IVA compresa – Fattura n. 917900002355 del 07/05/2017;
- Opere di allacciamento ai pubblici servizi: affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio n. 05 del 27/02/2017 alla ditta 2I rete Gas - importo € 2928,00 IVA compresa – Fattura n. 1700003053 del 31/03/2017;
- PUNTO 2.4 del Q.E. finale – MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI
 - Acquisto di pannelli fonoassorbenti - affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio n. 25 del 13/06/2019 alla ditta Spandre s.r.l. di San Carlo Canavese - importo € 3251,30 IVA compresa – Fattura n. 8/19 del 29/07/2019;
 - Posa di pannelli fonoassorbenti - affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio n. 25 del 13/06/2019 alla ditta Gallo Claudio di Monastero Bormida - importo € 2032,52 IVA compresa – Fattura n. 07 del 02/08/2019;
 - Realizzazione spazi sportivi esterni all’edificio per il completamento dell’area pertinenziale – affidato alla ditta Gepin Ter di Roveta Danilo di Bubbio - importo € 10.211,00 IVA compresa – Fattura n. 26/2 del 28/06/2019 Tale opera si è resa necessaria per la sistemazione dei campi polivalenti e delle aree pertinenziali esterne alla struttura polisportiva polivalente, altrimenti di difficile fruizione e di disagiata accesso.
- PUNTO 2.6 del Q.E. finale – ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI
 - L’atto di acquisto dei terreni su cui è stato costruito il centro polifunzionale – già nella disponibilità del Comune di Monastero Bormida in quanto ad esso affittati dalla proprietà da oltre un decennio – è stata una operazione particolarmente complessa poiché a seguito di un passaggio successorio il bene era di proprietà indivisa di una quindicina di soggetti. Dopo aver ottenuto la verifica di congruità da parte dell’agenzia del Demanio a seguito di valutazione tecnico-estimativa redatta dal geom. Giacomo Molinari, la cui stima di circa € 2,00 al mq. è stata sottoscritta da tutti i comproprietari, si è reso necessario rogare due atti, per l’impossibilità della compresenza di tutti i comproprietari; il primo atto – rep. 877 – ammonta complessivi € 28.660,36; il secondo a € 6363,64, per un totale di € 35.024,00. Il quadro economico di progetto e di variante, che prevedeva sotto tale voce un importo di € 15.026,48, è stato pertanto integrato in sede di contabilità finale, utilizzando le economie di spesa, per coprire tale importo, altrimenti gravante su fondi propri del Comune di Monastero Bormida
- PUNTO 2.8 del Q.E. finale – ACCANTONAMENTI PER IL FONDO DI CUI ALL’ART. 92 D.LGS. 163/2006
 - Gli accantonamenti per il R.U.P. vengono liquidati con la presente deliberazione, nei modi e nelle forme previste dalla normativa
- PUNTO 2.9 del Q.E. finale – SPESE PER STATI DI CONSISTENZA, FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI ECC.
 - Le spese per la relazione di valutazione tecnico-estimativa e quelle per l’accatastamento dell’immobile e delle aree polisportive adiacenti ad esso complementari, gravanti su fondi propri del Comune di Monastero Bormida, sono state inserite in sede di contabilità finale, utilizzando le economie di spesa.
 - Per la valutazione tecnico-estimativa - affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio al geom. Giacomo Molinari - importo € 1.268,80 IVA e CNG compresi – Fattura n. 11 del 17/04/2019;
 - Per l’accatastamento - affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio all’ing. Giovanni Guglieri - importo € 8.764,31 IVA e CNPAIA compresi – Fattura n. 20 del 28/09/2019
- PUNTO 2.10 del Q.E. finale – SPESE PER NOTIFICHE, REGISTRAZIONI E ROGITI
 - Imposta di registro e catastale per stipula atto € 2.678,28 – liquidata con mandato n. 1 del 15/01/2019 e n. 20 del 22/01/2019
 - Imposta di registro e catastale per stipula atto € 1.100,01 – liquidata con mandato n. 123 del 28/02/2019
 - Parere di Congruità Agenzia del Demanio € 300,00 – liquidato con mandato n. 146 del 26/03/2019
 - Diritti rogito € 377,69 – liquidati con mandato n. 199 del 27/03/2019
- PUNTO 2.12 del Q.E. finale – SPESE PER PUBBLICITA’ ART. 80 D.LGS. 163/2006

- Pubblicità di gara: affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio alla ditta Media Graphic - importo € 1150,00 oltre IVA di legge, totale € 1403,00 – Fattura n. 669 del 28/05/2015
- PUNTO 2.13 del Q.E. finale – SPESE PER VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO
 - Il collaudo statico è stato affidato con determinazione del Responsabile del Servizio all'ing. Luigino Branda di Acqui Terme – importo € 1966,64 IVA e oneri compresi – Fattura n. 001/2016 del 10/03/2016
- PUNTO 2.14 del Q.E. finale – CONTRIBUTI EX-AVCP
 - Liquidato con mandato n. 693 del 08/10/2019

EVIDENZIATO che sono state apportate anche le conseguenti modifiche e integrazioni al punto 2.14, relativo all'IVA sulle forniture o servizi integrati nel Q.E. finale rispetto al Q.E. di variante;

DATO ATTO che l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione ammonta, nel Q.E. finale, a € 256.867,32

PRESO ATTO che i progettisti e Direttori dei Lavori ing. Giovanni Guglieri e arch. Fabrizio Naldini hanno presentato la contabilità finale dei lavori e delle relative spese tecniche;

VISTA ED ESAMINATA la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione e i relativi certificati pagamento per le seguenti somme:

- € 6991,46 oltre IVA di legge a favore della ditta Impresa Capra di Alessandria, a saldo dei lavori eseguiti;
- € 1315,00 oltre IVA di legge e CNPAIA a favore dei tecnici incaricati ing. Giovanni Guglieri e arch. Fabrizio Naldini, a saldo delle spese tecniche

DATO ATTO che i lavori sono stati effettivamente eseguiti nella misura contabilizzata;

RITENUTO di provvedere alla approvazione e liquidazione;

RITENUTO inoltre necessario

- Dare atto della consistenza e della suddivisione delle somme a disposizione dell'Amministrazione come sopra evidenziate
- Provvedere alla liquidazione delle voci ancora da liquidare tra quelle evidenziate nel quadro economico finale per quanto riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione

RICHIAMATA la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente le indicazioni per le modalità di rendicontazione finale del contributo e l'elenco della documentazione necessaria;

VISTA la relazione finale asseverata conclusiva del R.U.P. contenente i quadri riassuntivi di tutte le spese sostenute da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la chiusura della pratica e l'erogazione del saldo del contributo;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», del favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, nonché sulla regolarità contabile della stessa espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in relazione alle previste spese e tutti in originale agli atti;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori di NUOVA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO MULTIFUNZIONALE COMUNALE "AUGUSTO MONTI, con il seguente quadro economico consuntivo:

1. LAVORI A BASE D'ASTA			
1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA			
1.1.1 Lavori a misura	€	-	
1.1.2 Lavori a corpo	€	751.323,92	
1.1.3 Lavori in economia	€	-	
1.1.4 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA	€	751.323,92	
1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI			
1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura	€	-	
1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo	€	31.674,80	
1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia	€	-	
1.2.4 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI	€	31.674,80	€ 703.132,68
1.3 COSTO STIMATO MANODOPERA:			
1.3.1 a) per lavori a misura	€	-	
1.3.2 b) a corpo	€	478.743,60	
1.3.3 c) in economia	€	-	
1.4 TOTALE COSTO STIMATO MANODOPERA	€	478.743,60	
1.4 LAVORI A BASE D'ASTA (al netto di costi manodopera e oneri per la sicurezza)			
1.4.1 a) a misura	€	-	
1.4.2 b) a corpo	€	272.580,32	
1.4.3 c) in economia	€	-	
1.5 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (al netto di costi manodopera e oneri sicurezza)	€	272.580,32	
RIBASSO d'asta del 29,30%			
29,30%	-€	79.866,03	
Importo dei lavori e delle spese al netto del ribasso d'asta		€	192.714,28
1.5 Importo totale dei lavori e delle spese 10° S.A.L. a tutto il 01/10/2018		€	703.132,68
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto		€	-
2.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari: a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro		€	3.316,85
2.3 Allacciamenti ai pubblici servizi: a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro		€	6.505,89
2.4 Maggiori lavori imprevisi, autorizzati con D.D. R.U.P. n. 25 del 13/06/2019		€	13.613,83
2.5 Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 133, comma 3, DLgs n.163/2006, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni		€	-
2.6 Acquisizione od espropriazione di aree o immobili a) acquisto		€	35.000,00
2.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)		€	72.070,91
2.8 Accantonamenti per fondo di cui all'Art. 92 DLgs.n.163/2006 (incentivi)		€	15.026,48
2.9 Spese per stati di consistenza, frazionamenti, accatastamento, scia antincendio, agibilità (compresi contributi integrativi casse di previdenza, oneri catastali e spese V.V.F.)		€	8.223,86
2.10 Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni, rogito di acquisto		€	4.455,97
2.11 Spese per commissioni giudicatrici art.84 DLgs.n.163/2006		€	506,00
2.12 Spese per pubblicità art.80 DLgs.n.163/2006 Spese per opere d'arte		€	1.150,00
2.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)		€	3.673,88
2.14 Contributo ex A.V.C.P.		€	375,00
I.V.A. su lavori di:			
a) eliminazione barriere architettoniche		base imponibile	% IVA IVA
b) costruzione opere di urbanizzazione	€	703.132,68	4% € -
c) ristrutturazione, risanamento e restauro	€	-	10% € 70.313,27
d) manutenzione straordinaria			10% € -
e) altri lavori	€	-	22% € -
I.V.A. su somme a disposizione:			
f) lavori in economia	€	-	22% € -
g) rilievi, accertamenti, indagini	€	3.316,85	22% € 729,71
h) allacciamenti IVA 10	€	2.155,13	10% € 215,51
i) allacciar IVA 22	€	4.350,76	22% € 957,17
j) lavori imprevisi IVA 10	€	9.282,83	10% € 928,28
k) lavori imprevisi IVA 22	€	4.331,00	22% € 952,82
l) incremento del prezzo chiuso	€	-	22% € -
m) spese tecniche	€	72.070,91	22% € 15.855,60
n) spese per stati di consistenza, frazionamenti	€	8.223,86	22% € 1.809,25
o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni	€	-	0% € -
p) commissioni giudicatrici	€	-	0% € -
q) pubblicità	€	1.150,00	22% € 253,00
r) accertamenti di laboratorio, collaudi	€	3.673,88	22% € 808,25
TOTALE PER IVA		€	92.822,86
2.16 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	256.741,53
3. IMPORTO TOTALE CONSUNTIVO LAVORI E SPESE a tutto il 20/09/2019			€ 959.874,21
4. IMPORTO COMPLESSIVO INIZIALE DEL PROGETTO			€ 960.000,00
5. RESIDUO INUTILIZZATO			€ 125,79

DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione e i certificati di pagamento allegati alla contabilità finale.

DI LIQUIDARE all'Impresa CAPRA di Alessandria, esecutrice dei lavori la somma di € 6991,46 oltre IVA di legge per saldo lavori, come risulta dal Certificato di pagamento del S.A.L. X e dal Certificato di regolare Esecuzione;

DI LIQUIDARE la somma di € 1315,00 oltre IVA di legge e CNPAIA a saldo spese tecniche a favore dei tecnici incaricati ing. Giovanni Guglieri e arch. Fabrizio Naldini;

DI LIQUIDARE la somma di € 3251,30 IVA compresa – Fattura n. 8/19 del 29/07/2019 alla ditta Spandre s.r.l. di San Carlo Canavese per fornitura di pannelli fonoassorbenti;

DI LIQUIDARE la somma di € 2032,52 IVA compresa alla ditta Claudio Gallo di Monastero Bormida - Fattura n. 07 del 02/08/2019 - per posa pannelli fonoassorbenti;

DI LIQUIDARE la somma di € 6.907,56 oltre IVA e CNPAIA di legge a saldo spese per accatastamento oltre iva al 22% ed oneri all'ing. Giovanni Guglieri;

DI LIQUIDARE inoltre le seguenti somme destinate agli incentivi di cui all' art. 113 d.lgs 50/2016 pari allo 1,5% dell'importo lavori:

- geom. Mauro Ciprotti €. 7.513,24
- dott.sa Susanna Blengio €. 3.756,62;
- p.i. Ceretti Pier Augusto €. 3.756,62;

DI DARE ATTO che la somma totale liquidata è imputata alla voce 7830/2170/1 codice 2.06.02.01 del corrente bilancio di previsione 2019/2021, gestione residui;

DI DARE ATTO che i lavori eseguiti e contemplati nella contabilità finale dei lavori in oggetto sono tutti inerenti al progetto approvato citato in premessa;

DI INCARICARE il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di predisporre la documentazione necessaria da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la liquidazione del saldo del contributo, in unica soluzione;

DI APPROVARE la relazione finale asseverata conclusiva del R.U.P. contenente i quadri riassuntivi di tutte le spese sostenute da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la chiusura della pratica e l'erogazione del saldo del contributo;

stante l'urgenza, con successiva votazione unanime favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Gallareto Dott. Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dodero Dott. Marco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
all'Albo Pretorio telematico di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE TRASMISSIONI E COMUNICAZIONI

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che del presente verbale di deliberazione:

- ☐ è stata data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari;
- ☐ ne è stata trasmessa copia, contestualmente alla pubblicazione, alla Prefettura di Asti, ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» poiché concerne acquisti, alienazioni, appalti ed, in genere, contratti;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dodero Dott. Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____ ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dodero Dott. Marco

PARERI

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario / Amministrativo e Tecnico, ciascuna per la propria competenza, visti gli artt. 49 e 151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

X sulla regolarità amministrativa della proposta – artt. 49,147 bis- 1° comma D.Lgs. 267/2000

___ sulla regolarità contabile della proposta, ai sensi artt. 49, 147 bis – 1° comma anche ai sensi dell'art. 151 c. 4° D.Lgs. 267/2000 e si attesta anche la copertura finanziaria della spesa

___ sulla regolarità tecnica

Addì

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dodero Dott. Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Blengio Susanna

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Ciprotti Geom. Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dodero Dott. Marco
